

PONTILHÃO - Subtrecho 1.4

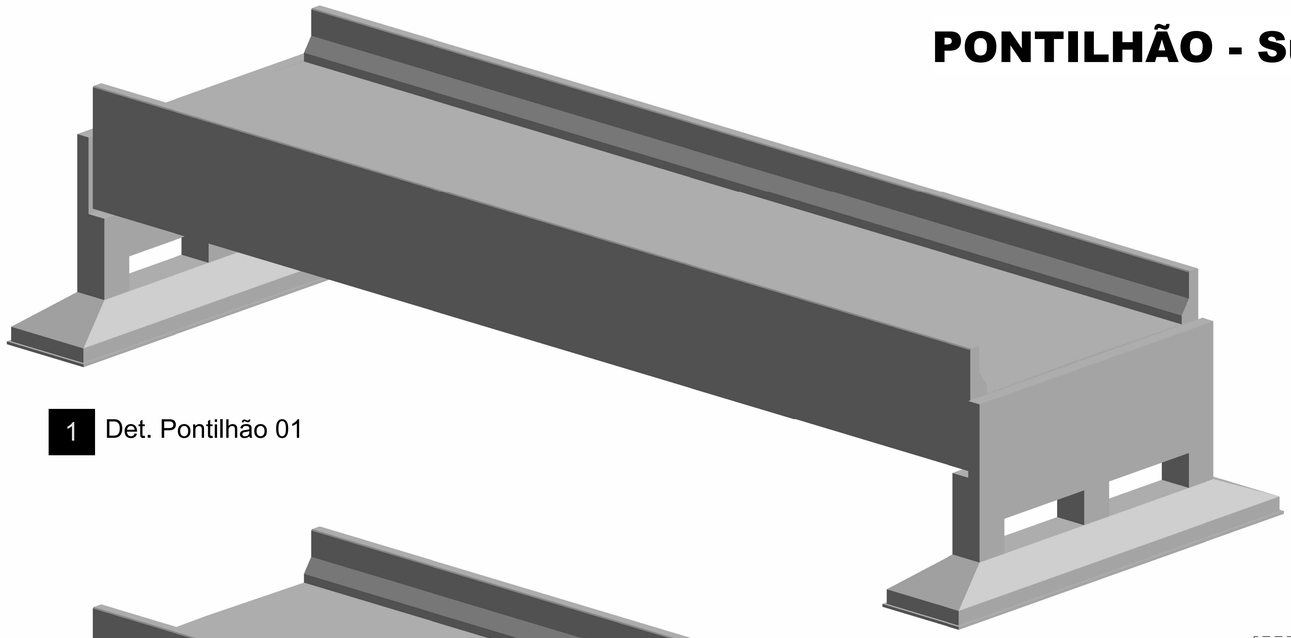


1 Det. Pontilhão 01


INFORMAÇÕES			
FASE	DESCRIÇÃO	VOLUME (m³)	FÔRMA (m²)
1	CONCRETO MAGRO	0,66	0,00
2	SAPATA	6,44	4,67
3	PILARES FUNDAÇÃO	0,65	4,32
4	TRANSVERSINA - FASE 1	2,71	10,00
5	TRANSVERSINA - FASE 2	1,88	15,68
6	LONGARINAS	23,63	116,22
6.1	VIGA DE TRAVAMENTO	0,75	11,11
7	LAJE	29,39	80,78
8	GUARDA RODAS	9,47	70,98
	TOTAL	75,58	313,76

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT mm	COMPR m	PESO Kg
50	6.3	1126	276
50	8	3.674	1451
50	10	5942	3666
50	12.5	2381	2293
50	16	677	1068
50	25	1756	6766
PESO TOTAL (50) =			15520

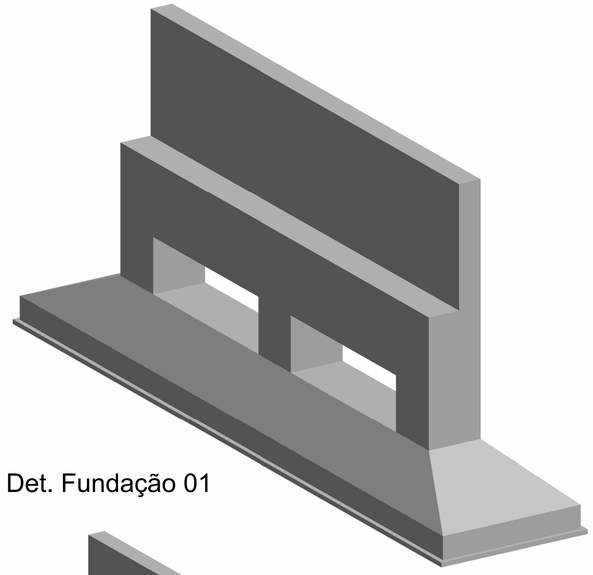


4 Det. Fundação 01



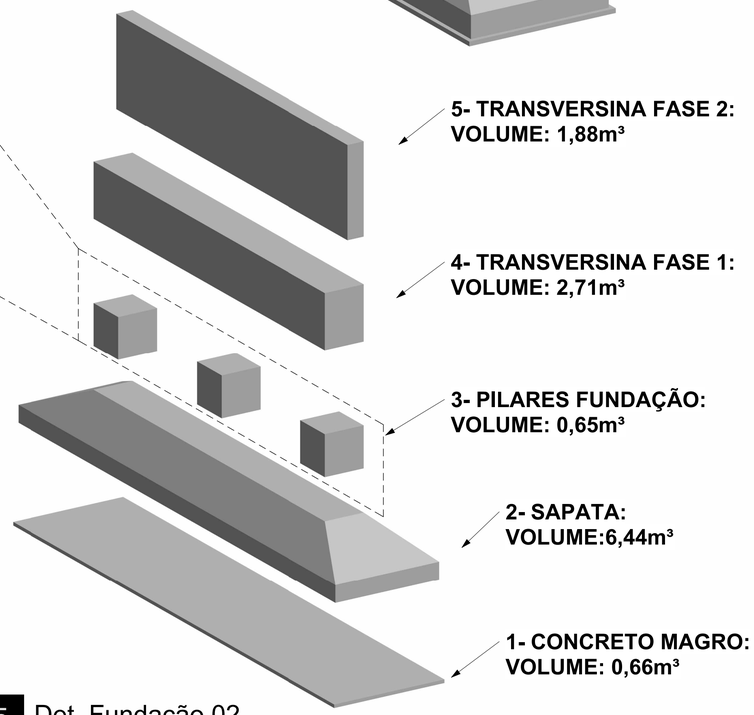

5 Det. Fundação 02

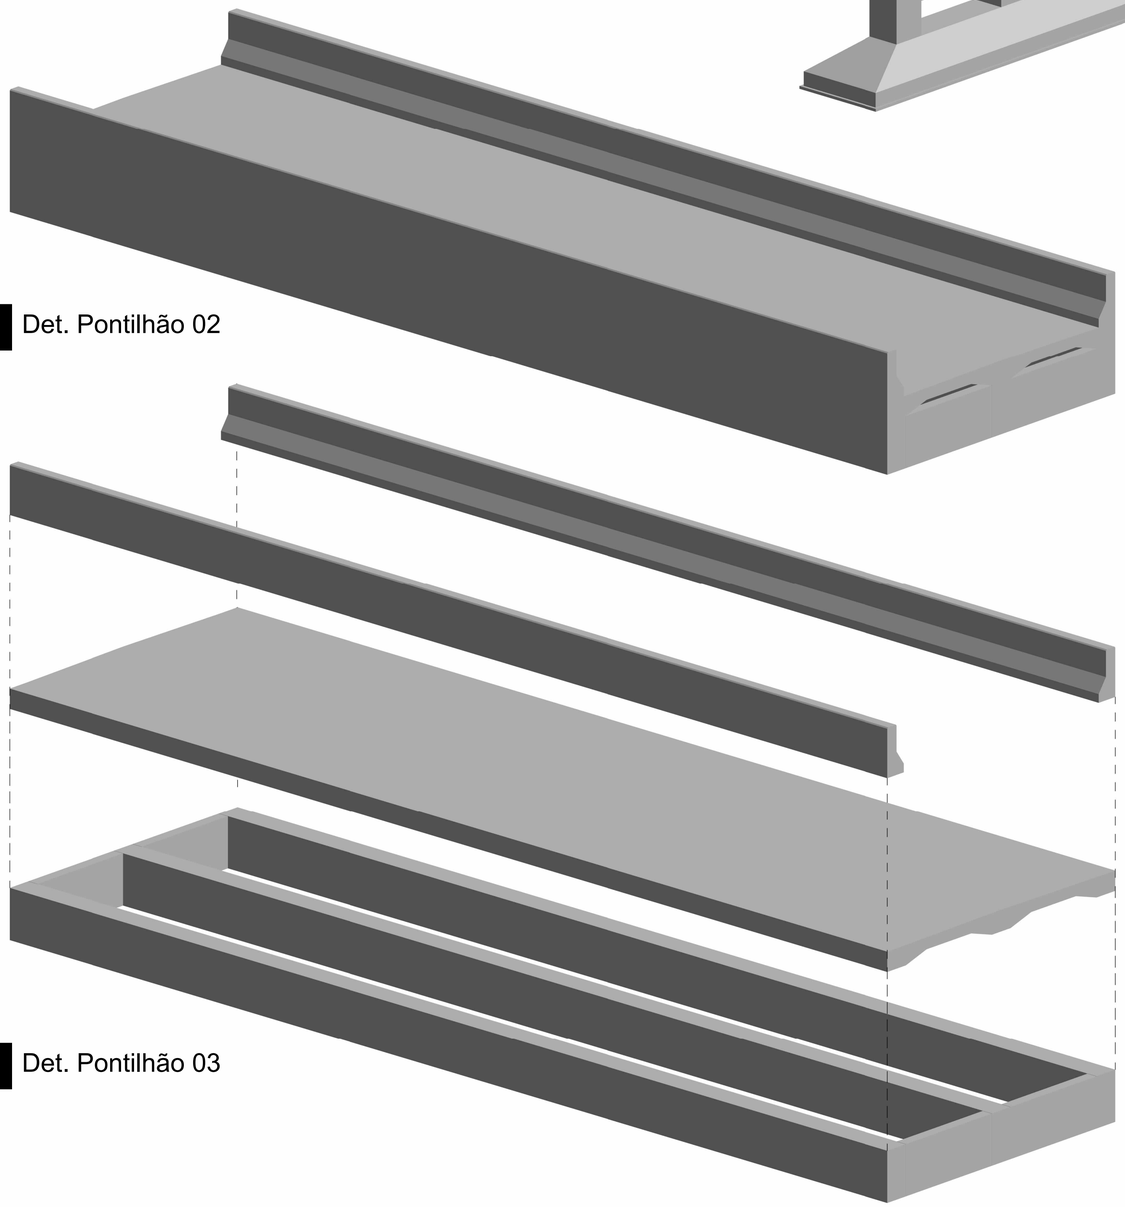

3 Det. Pontilhão 03

CONTROLE DE EXECUÇÃO										
OBRA	ESTACA	FUNDAÇÃO					PONTILHÃO			
		MAGRO	SAPATA	PILARES FUNDAÇÃO	TRANSVERSINA FASE 1	TRANSVERSINA FASE 2	LONGARINAS	VIGA DE TRAVAMENTO	LAJE	GUARDA RODAS
PONTILHÃO 36	117+400									
PONTILHÃO 37	123+800									
PONTILHÃO 38	127+470									
PONTILHÃO 41	132+700									
PONTILHÃO 44	134+380									
PONTILHÃO 45	140+260									

LEGENDA	
	EXECUTADO
	ANDAMENTO

ELABORADO POR CARLOS RAMALHO
