ESTRUTURA DE CONCORDÂNCIA TIPO 01

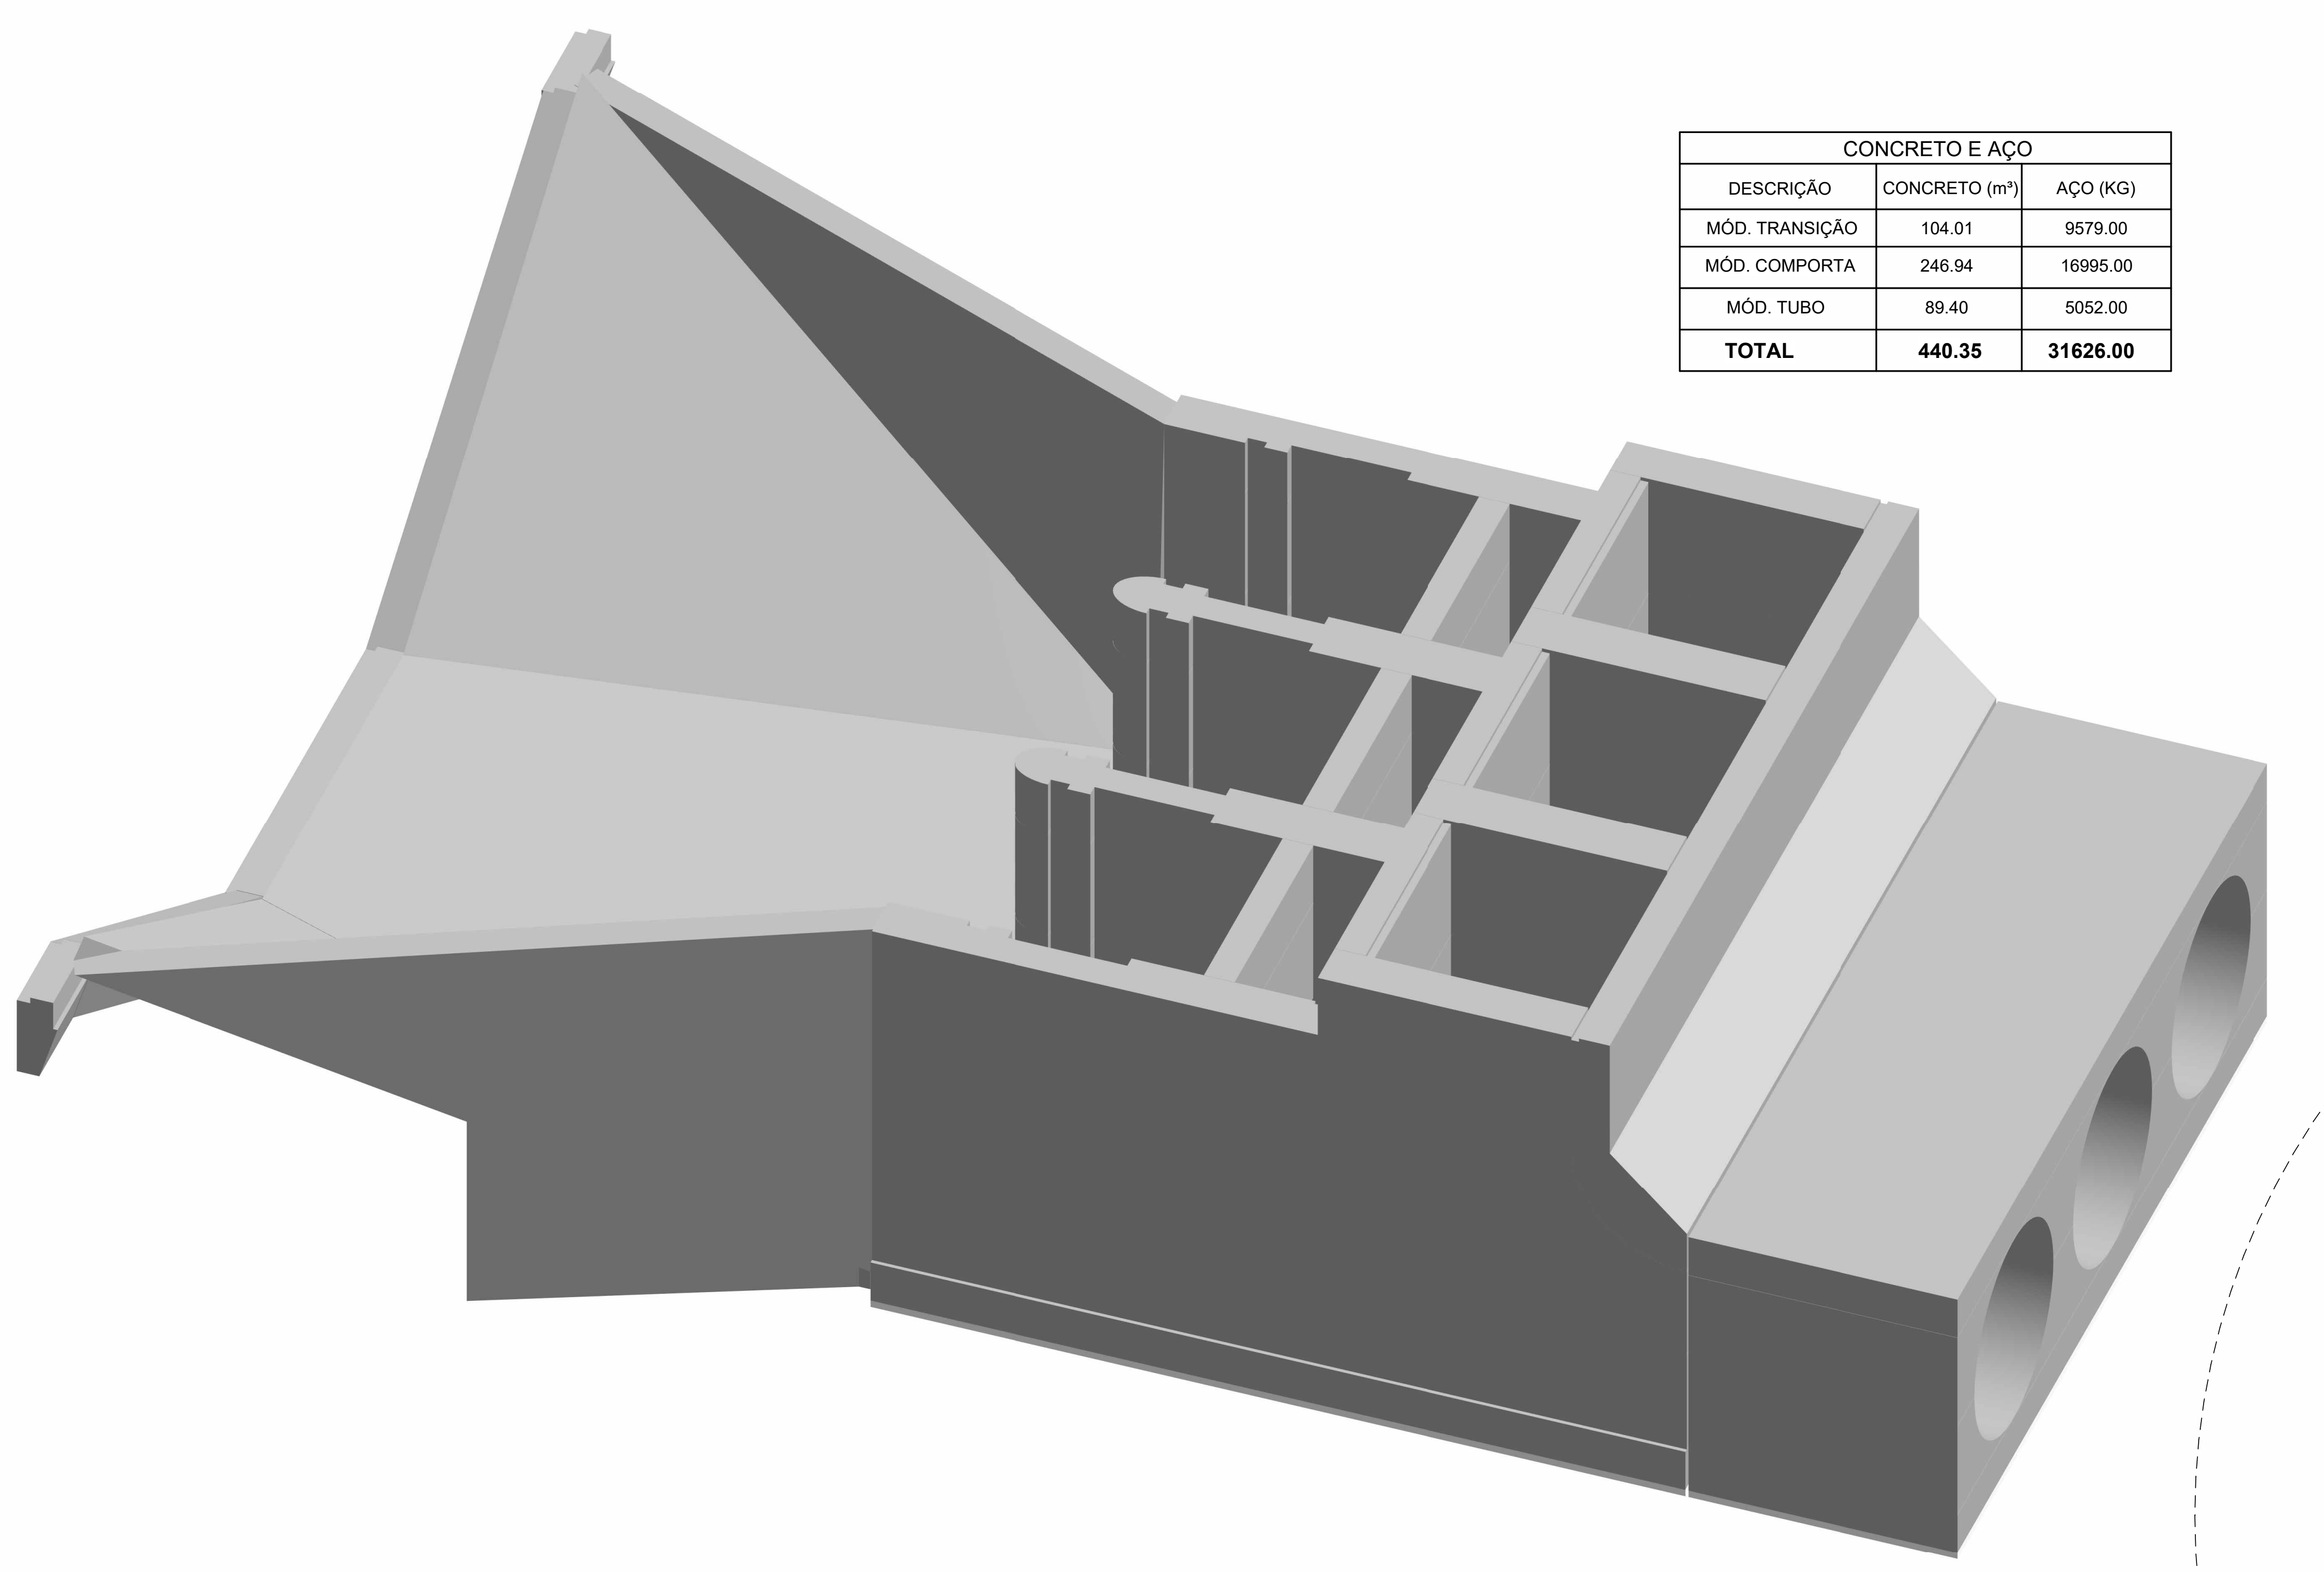

CONCRETO E AÇO		
DESCRIÇÃO	CONCRETO (m³)	AÇO (KG)
MÓD. TRANSIÇÃO	104.01	9579.00
MÓD. COMPORTA	246.94	16995.00
MÓD. TUBO	89.40	5052.00
TOTAL	**440.35**	**31626.00**

LEGENDA DE EXECUÇÃO	
☒	ANDAMENTO
🟩	EXECUTADO

CONTROLE DE EXECUÇÃO																						
OBRA	TIPO	TRANSIÇÃO CANAL									MÓDULO COMPORTA							MÓDULO TUBO				
		MAGRO	FASE 01	FASE 02	FASE 03	FASE 04	FASE 05				MAGRO	FASE 01	FASE 02	FASE 03	FASE 04	FASE 05	FASE 06	MAGRO	FASE 01	FASE 02	FASE 03	FASE 04
							NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4												
EMBOQUE SOVADO	1	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒
DESEMBOQUE SOVADO	1																					
EMBOQUE SERRA DO JUÁ	1																					
DESEMBOQUE SERRA DO JUÁ	1																					
EMBOQUE PAI MANÉ	1	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒
DESEMBOQUE PAI MANÉ	1	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒	🟩☒
DESEMBOQUE CANOA 1	1																					
EMBOQUE CANOA 2	1																					
DESEMBOQUE CANOA 2	1																					
EMBOQUE FUNDO 1	1																					
EMBOQUE FUNDO 2	1																					

ELABORADO POR CARLOS RAMALHO

MÓDULO TRANSIÇÃO

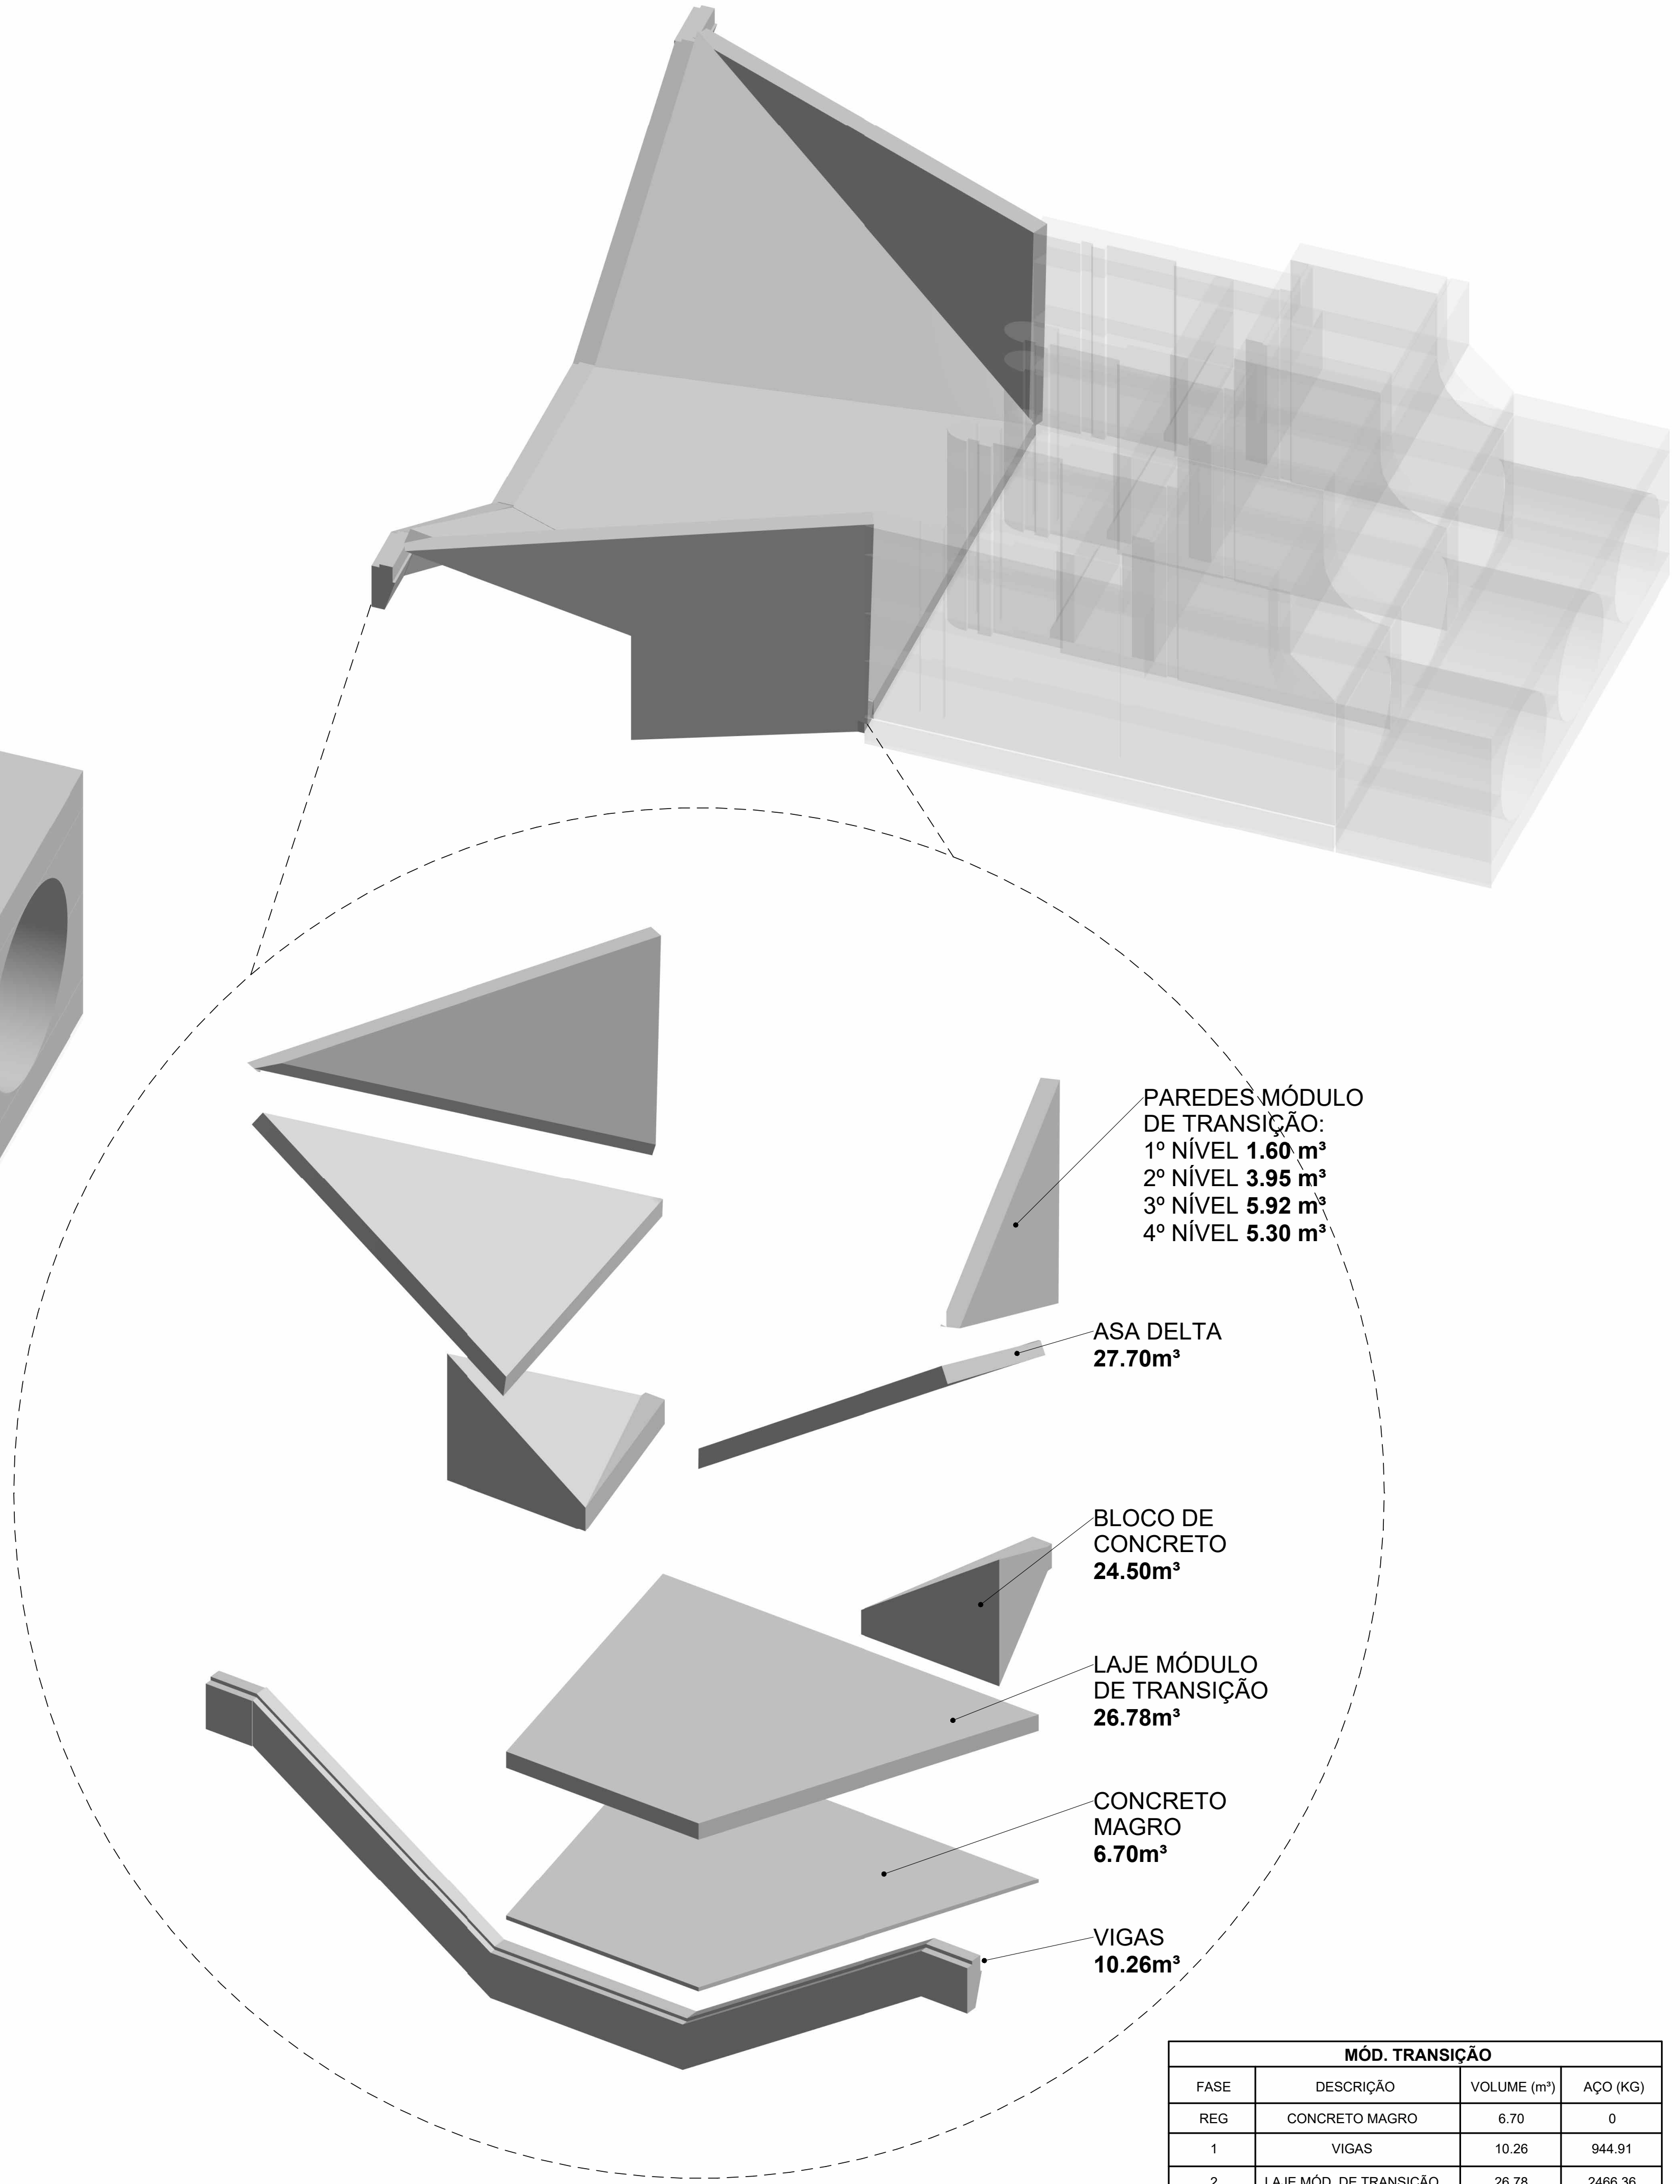
PAREDES MÓDULO DE TRANSIÇÃO:
1º NÍVEL **1.60 m³**
2º NÍVEL **3.95 m³**
3º NÍVEL **5.92 m³**
4º NÍVEL **5.30 m³**
ASA DELTA **27.70m³**
BLOCO DE CONCRETO **24.50m³**
LAJE MÓDULO DE TRANSIÇÃO **26.78m³**
CONCRETO MAGRO **6.70m³**
VIGAS **10.26m³**

MÓD. TRANSIÇÃO			
FASE	DESCRIÇÃO	VOLUME (m³)	AÇO (KG)
REG	CONCRETO MAGRO	6.70	0
1	VIGAS	10.26	944.91
2	LAJE MÓD. DE TRANSIÇÃO	26.78	2466.36
3	BLOCO DE CONCRETO	24.50	2256.37
4	ASA DELTA	27.70	2551.08
5	PAREDES MÓDULO DE TRANSIÇÃO: 1º NÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 4º NÍVEL	1.60 3.95 3.92 5.30	147.36 363.78 545.21 488.11
TOTAL		**104.01**	**9579.00**

MÓDULO COMPORTA

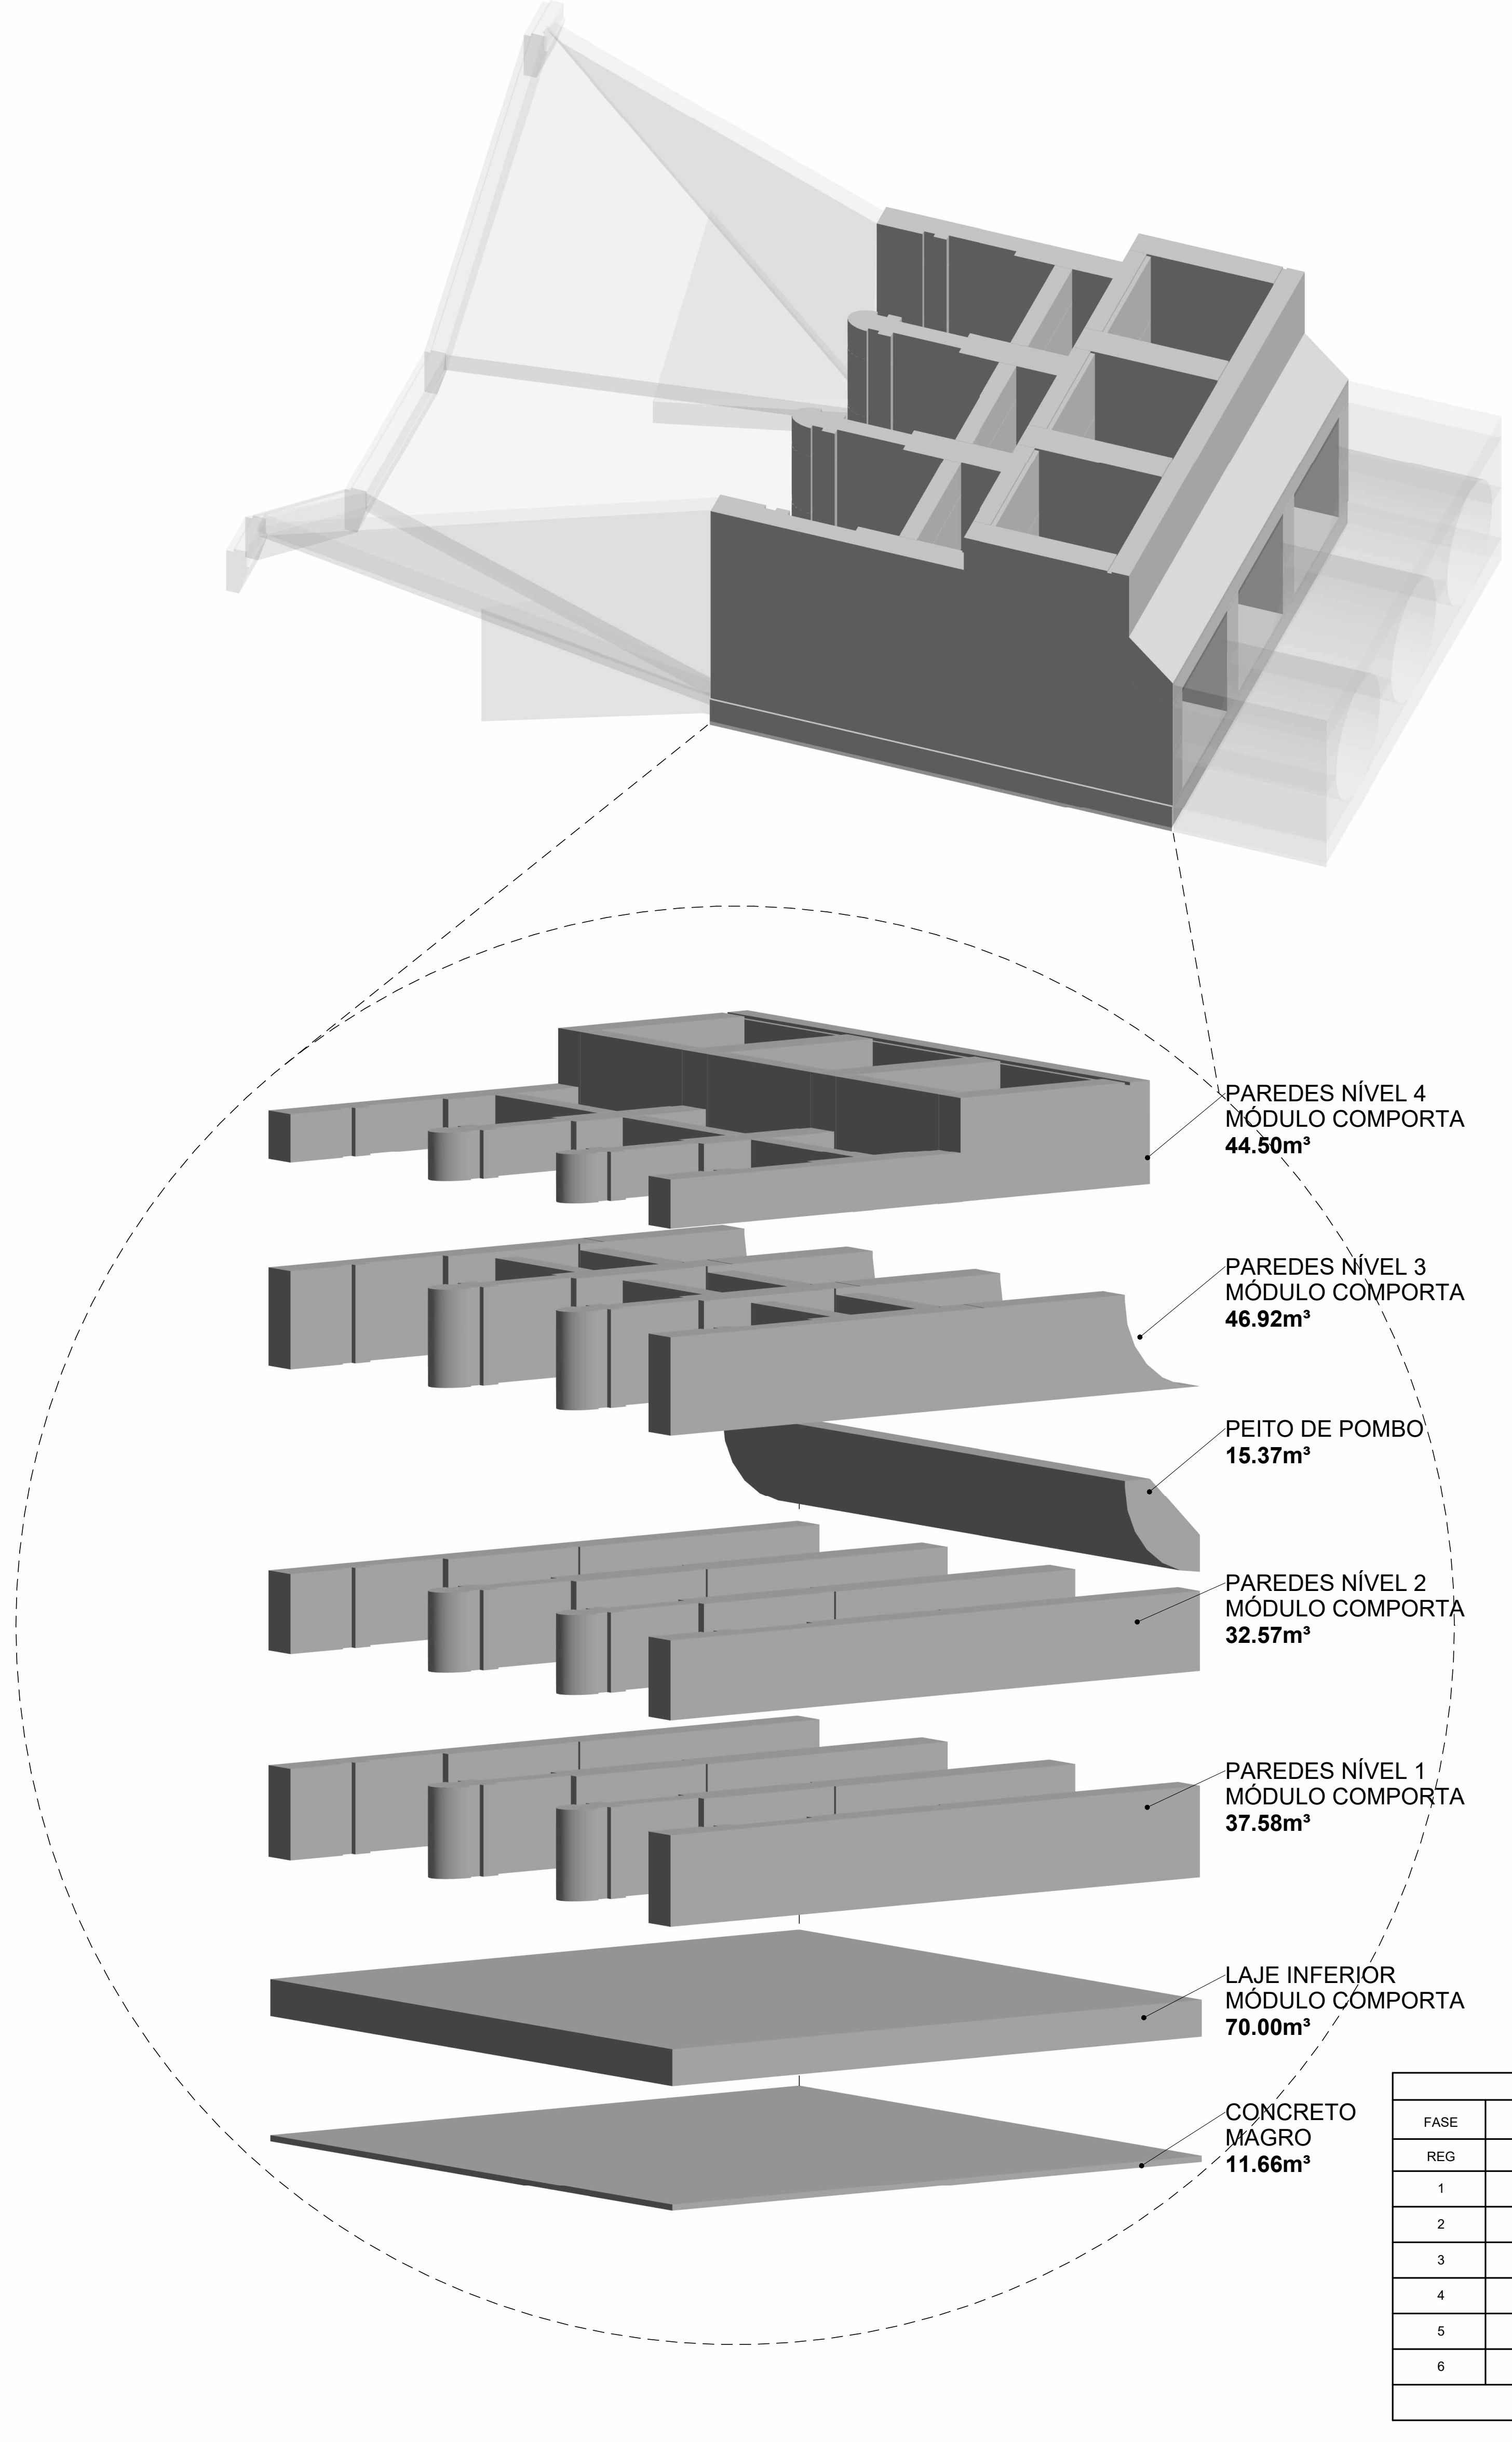
PAREDES NÍVEL 4 MÓDULO COMPORTA **44.50m³**
PAREDES NÍVEL 3 MÓDULO COMPORTA **46.92m³**
PEITO DE POMBO **15.37m³**
PAREDES NÍVEL 2 MÓDULO COMPORTA **32.57m³**
PAREDES NÍVEL 1 MÓDULO COMPORTA **37.58m³**
LAJE INFERIOR MÓDULO COMPORTA **70.00m³**
CONCRETO MAGRO **11.66m³**

MÓD. COMPORTA			
FASE	DESCRIÇÃO	VOLUME (m³)	AÇO (KG)
REG	CONCRETO MAGRO	11.66	0.00
1	LAJE INFERIOR	70.00	4817.57
2	PAREDES NÍVEL 1	37.58	2586.35
3	PAREDES NÍVEL 2	32.57	2241.55
4	PEITO DE POMBO	15.37	1057.8
5	PAREDES NÍVEL 3	46.92	3229.15
6	PAREDES NÍVEL 4	44.50	3062.6
TOTAL		**246.94**	**16995.00**

MÓDULO TUBO

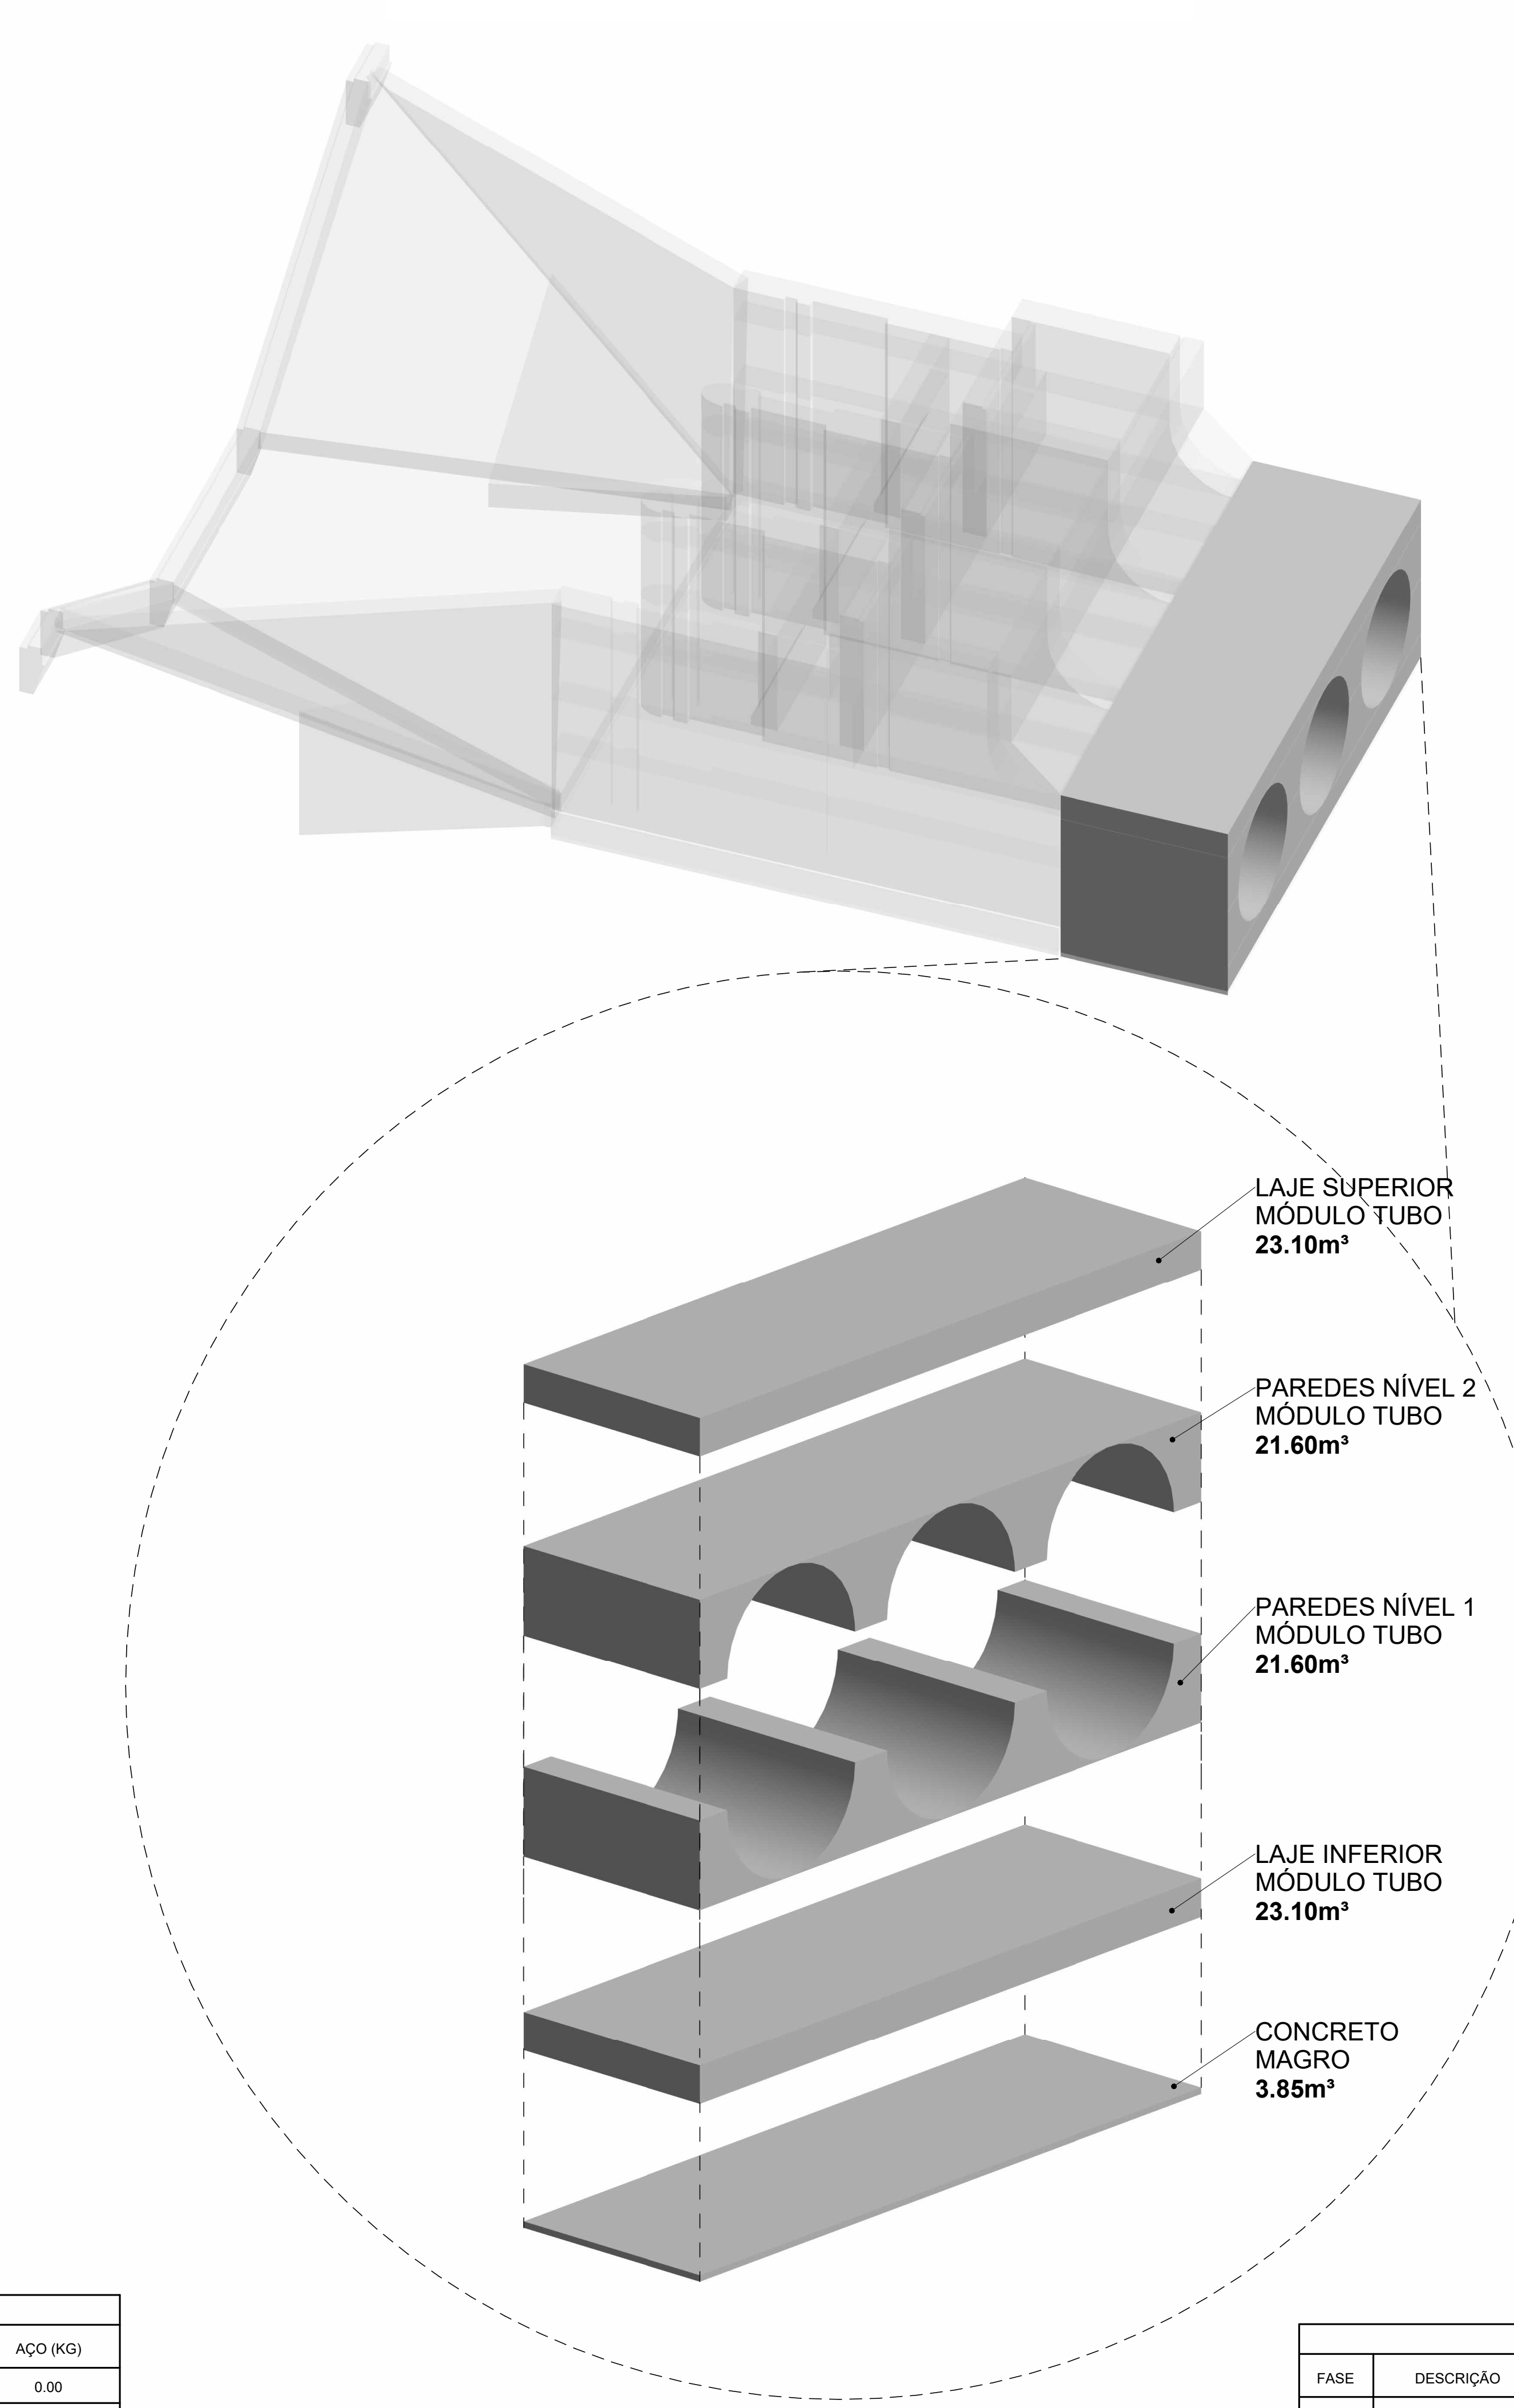
LAJE SUPERIOR MÓDULO TUBO **23.10m³**
PAREDES NÍVEL 2 MÓDULO TUBO **21.60m³**
PAREDES NÍVEL 1 MÓDULO TUBO **21.60m³**
LAJE INFERIOR MÓDULO TUBO **23.10m³**
CONCRETO MAGRO **3.85m³**

MÓD. TUBO			
FASE	DESCRIÇÃO	VOLUME (m³)	AÇO (KG)
REG	CONCRETO MAGRO	3.85	0.00
1	LAJE INFERIOR	23.10	1305.38
2	PAREDES NÍVEL 1	21.60	1220.62
3	PAREDES NÍVEL 2	21.60	1220.62
4	LAJE SUPERIOR	23.10	1305.38
TOTAL		**89.40**	**5052.00**
