ESTRUTURA DE CONCORDÂNCIA TIPO 02

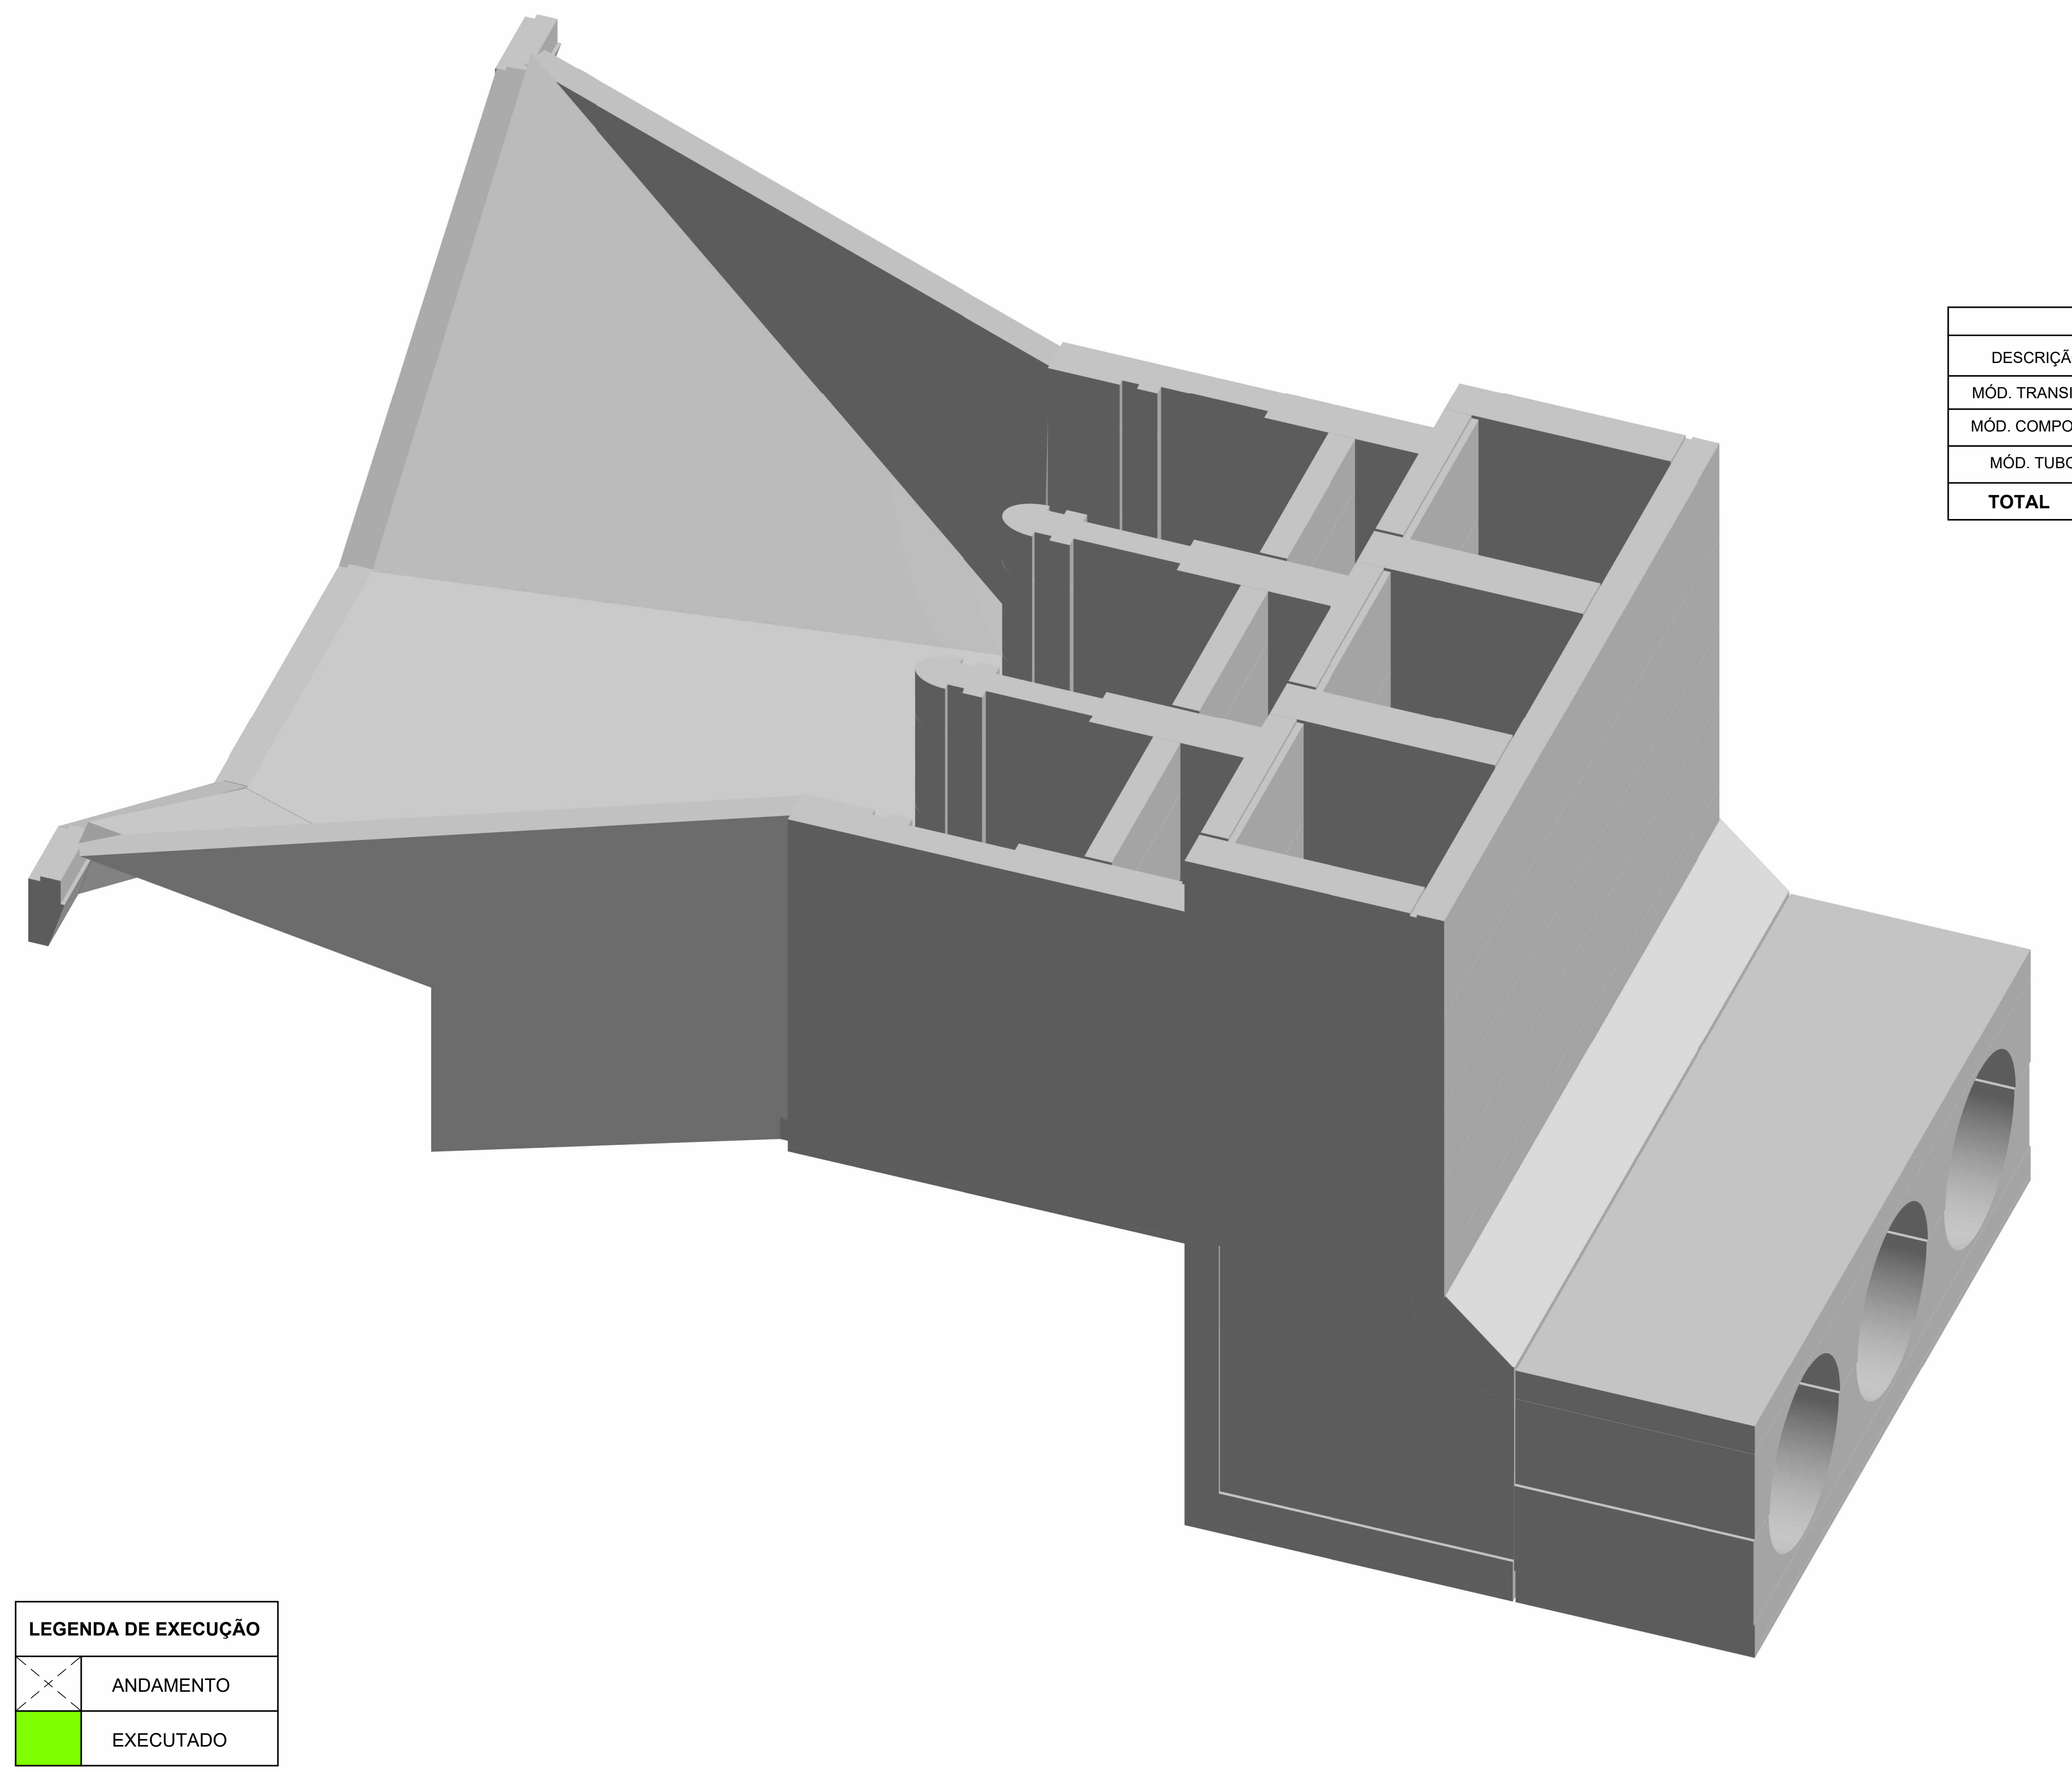

CONCRETO E AÇO		
DESCRIÇÃO	CONCRETO (m³)	AÇO (KG)
MÓD. TRANSIÇÃO	104.01	9579.00
MÓD. COMPORTA	341.40	21773.00
MÓD. TUBO	89.40	5052.00
TOTAL	**534.81**	**36404.00**

LEGENDA DE EXECUÇÃO	
☒	ANDAMENTO
🟩	EXECUTADO

CONTROLE DE EXECUÇÃO

OBRA	TIPO	TRANSIÇÃO CANAL									MÓDULO COMPORTA											MÓDULO TUBO				
		MAGRO	VIGA	LAJE	BLOCO DE CONCRETO	ASA DELTA	PAREDES				MAGRO FOSSO	LAJE	PAREDE 01	PAREDE 02	PAREDE 03 + PEITO DE POMBO	CONCRETO MAGRO	LAJE + TRANSIÇÃO FOSSO	PAREDE 04	PAREDE 05	PAREDE 06	PAREDE 07	MAGRO	LAJE INFERIOR	PAREDE 01	PAREDE 02	LAJE SUPERIOR
							NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4																
EMBOQUE CARÁS	2	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
DESEMBOQUE CARÁS	2																									
EMBOQUE CALDEIRÃO	2																									
DESEMBOQUE CALDEIRÃO	2																									
EMBOQUE CANOA 1	2																									

ELABORADO POR CARLOS RAMALHO

MÓDULO TRANSIÇÃO

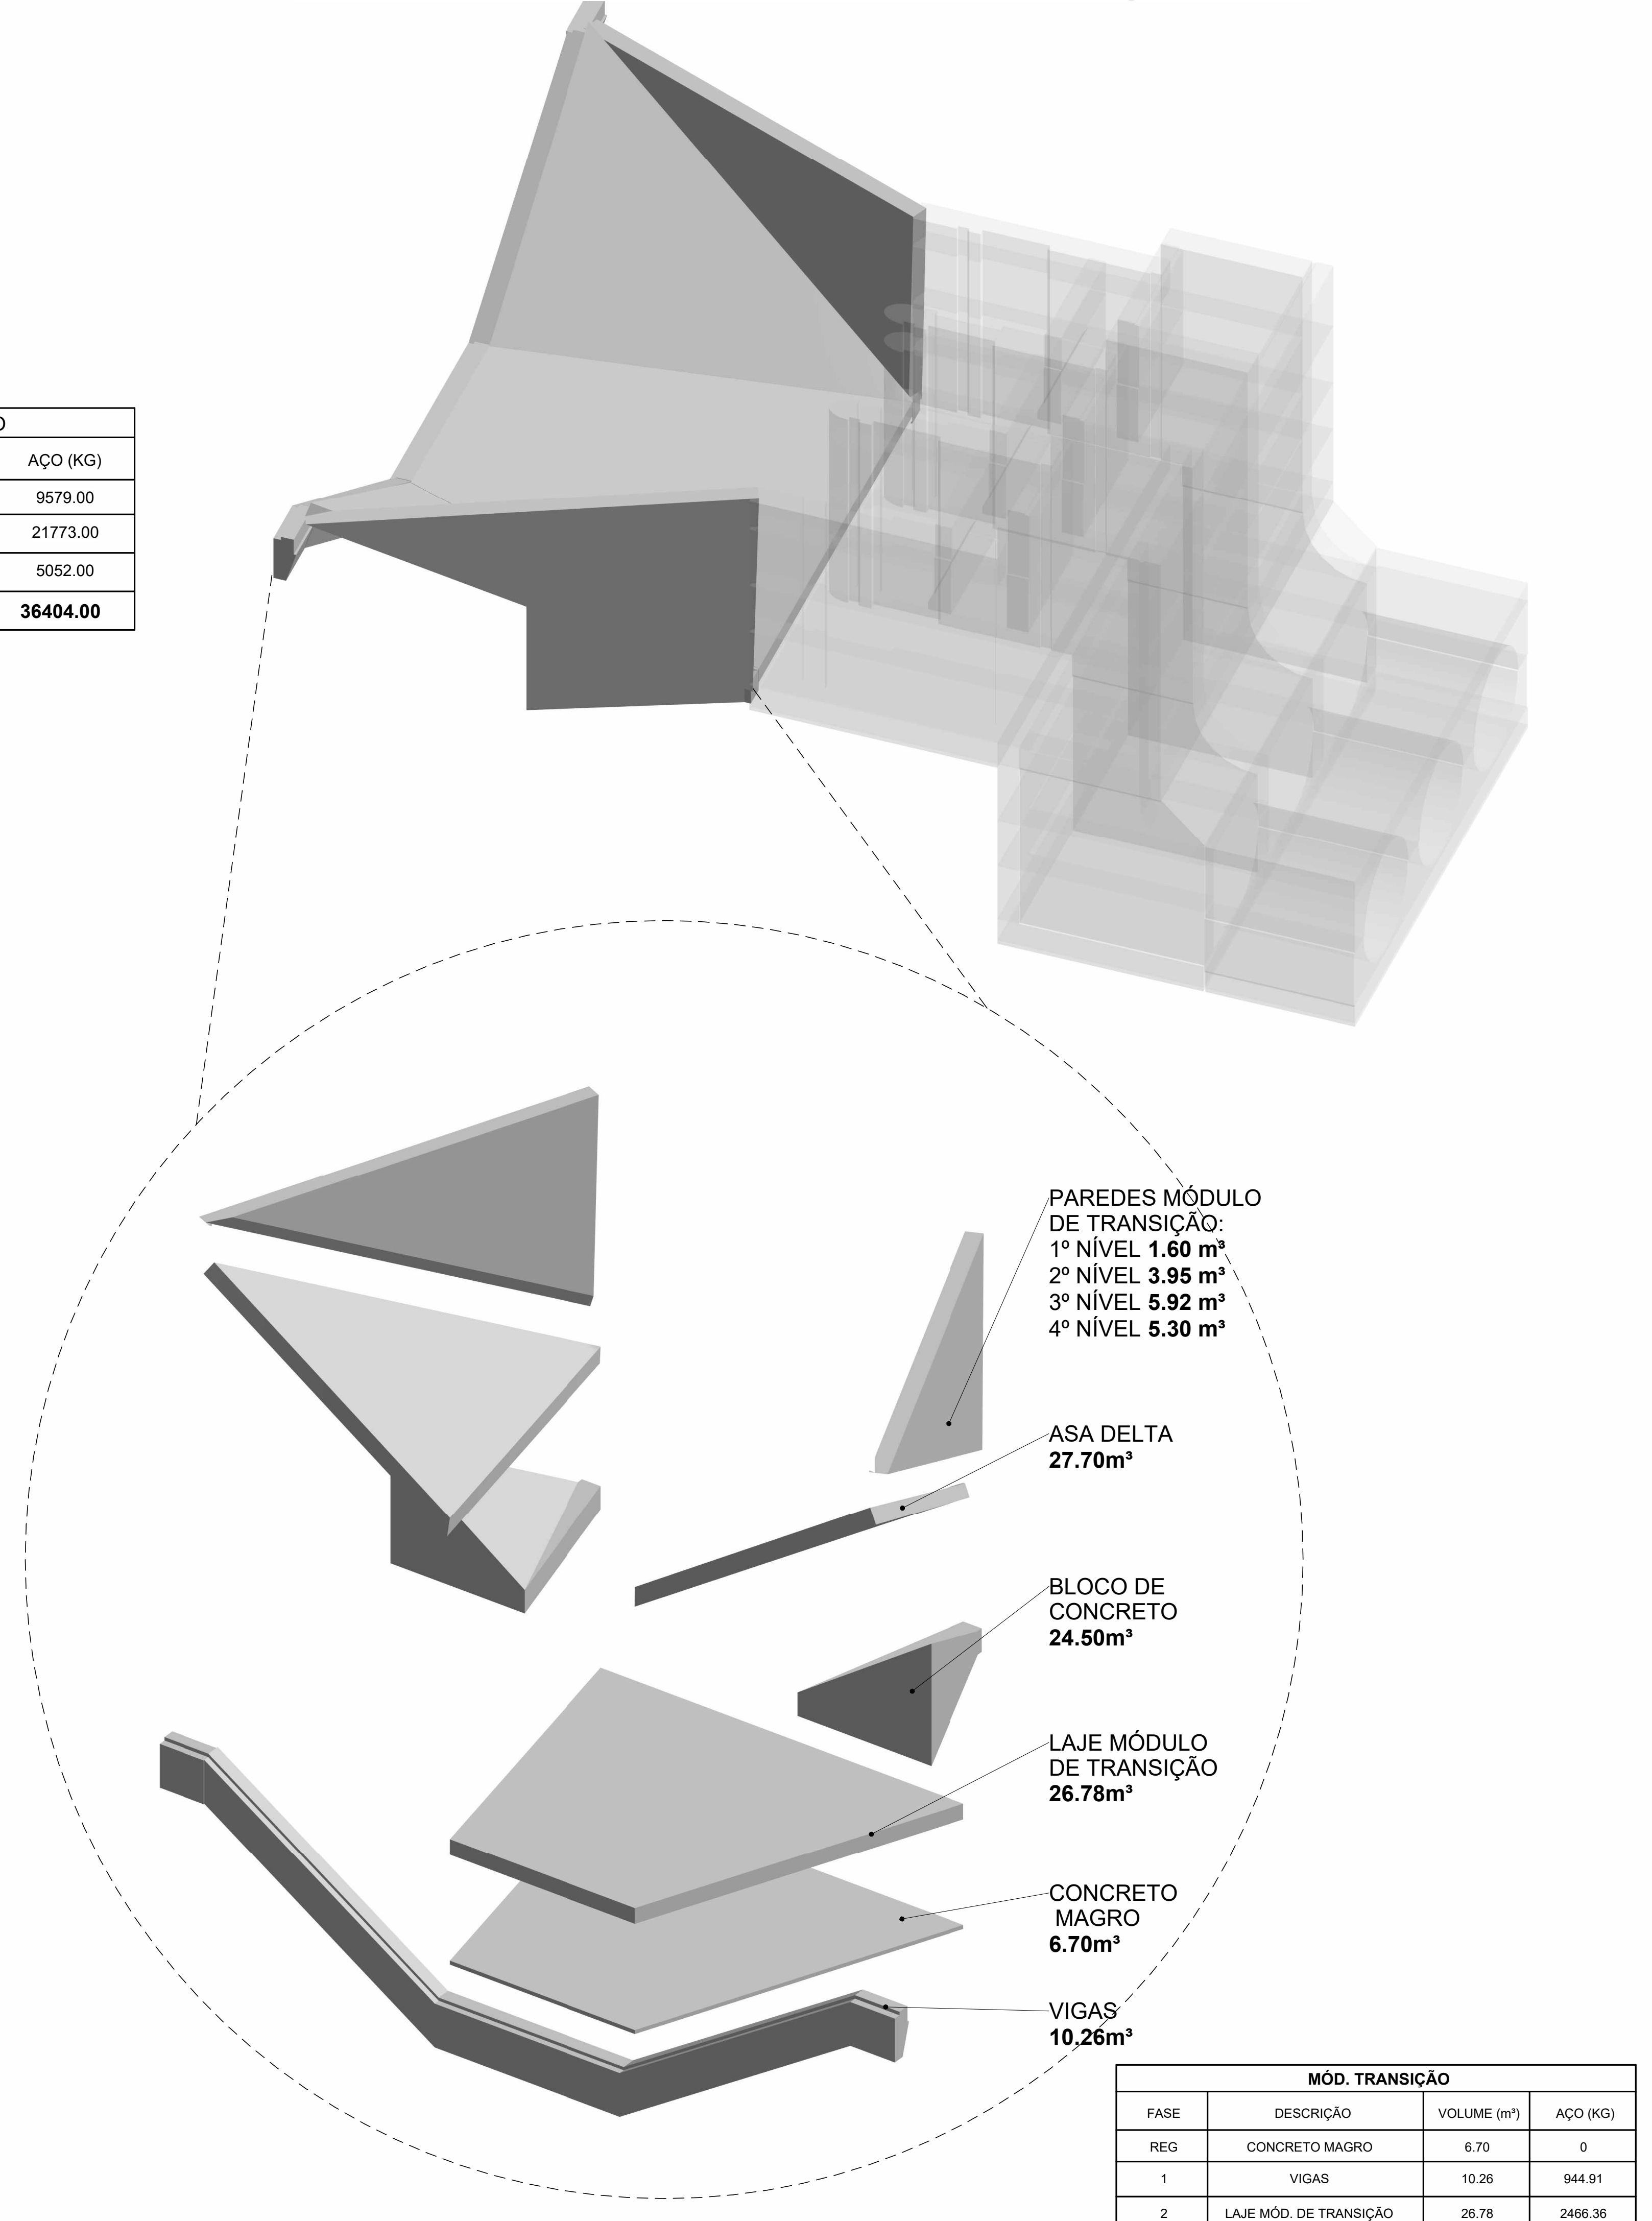

MÓD. TRANSIÇÃO			
FASE	DESCRIÇÃO	VOLUME (m³)	AÇO (KG)
REG	CONCRETO MAGRO	6.70	0
1	VIGAS	10.26	944.91
2	LAJE MÓD. DE TRANSIÇÃO	26.78	2466.36
3	BLOCO DE CONCRETO	24.50	2256.37
4	ASA DELTA	27.70	2551.08
5	PAREDES MÓDULO DE TRANSIÇÃO: 1º NÍVEL 2º NÍVEL 3º NÍVEL 4º NÍVEL	 1.60 3.95 3.92 5.30	 147.36 363.78 545.21 488.11
TOTAL		**104.01**	**9579.00**

MÓDULO COMPORTA

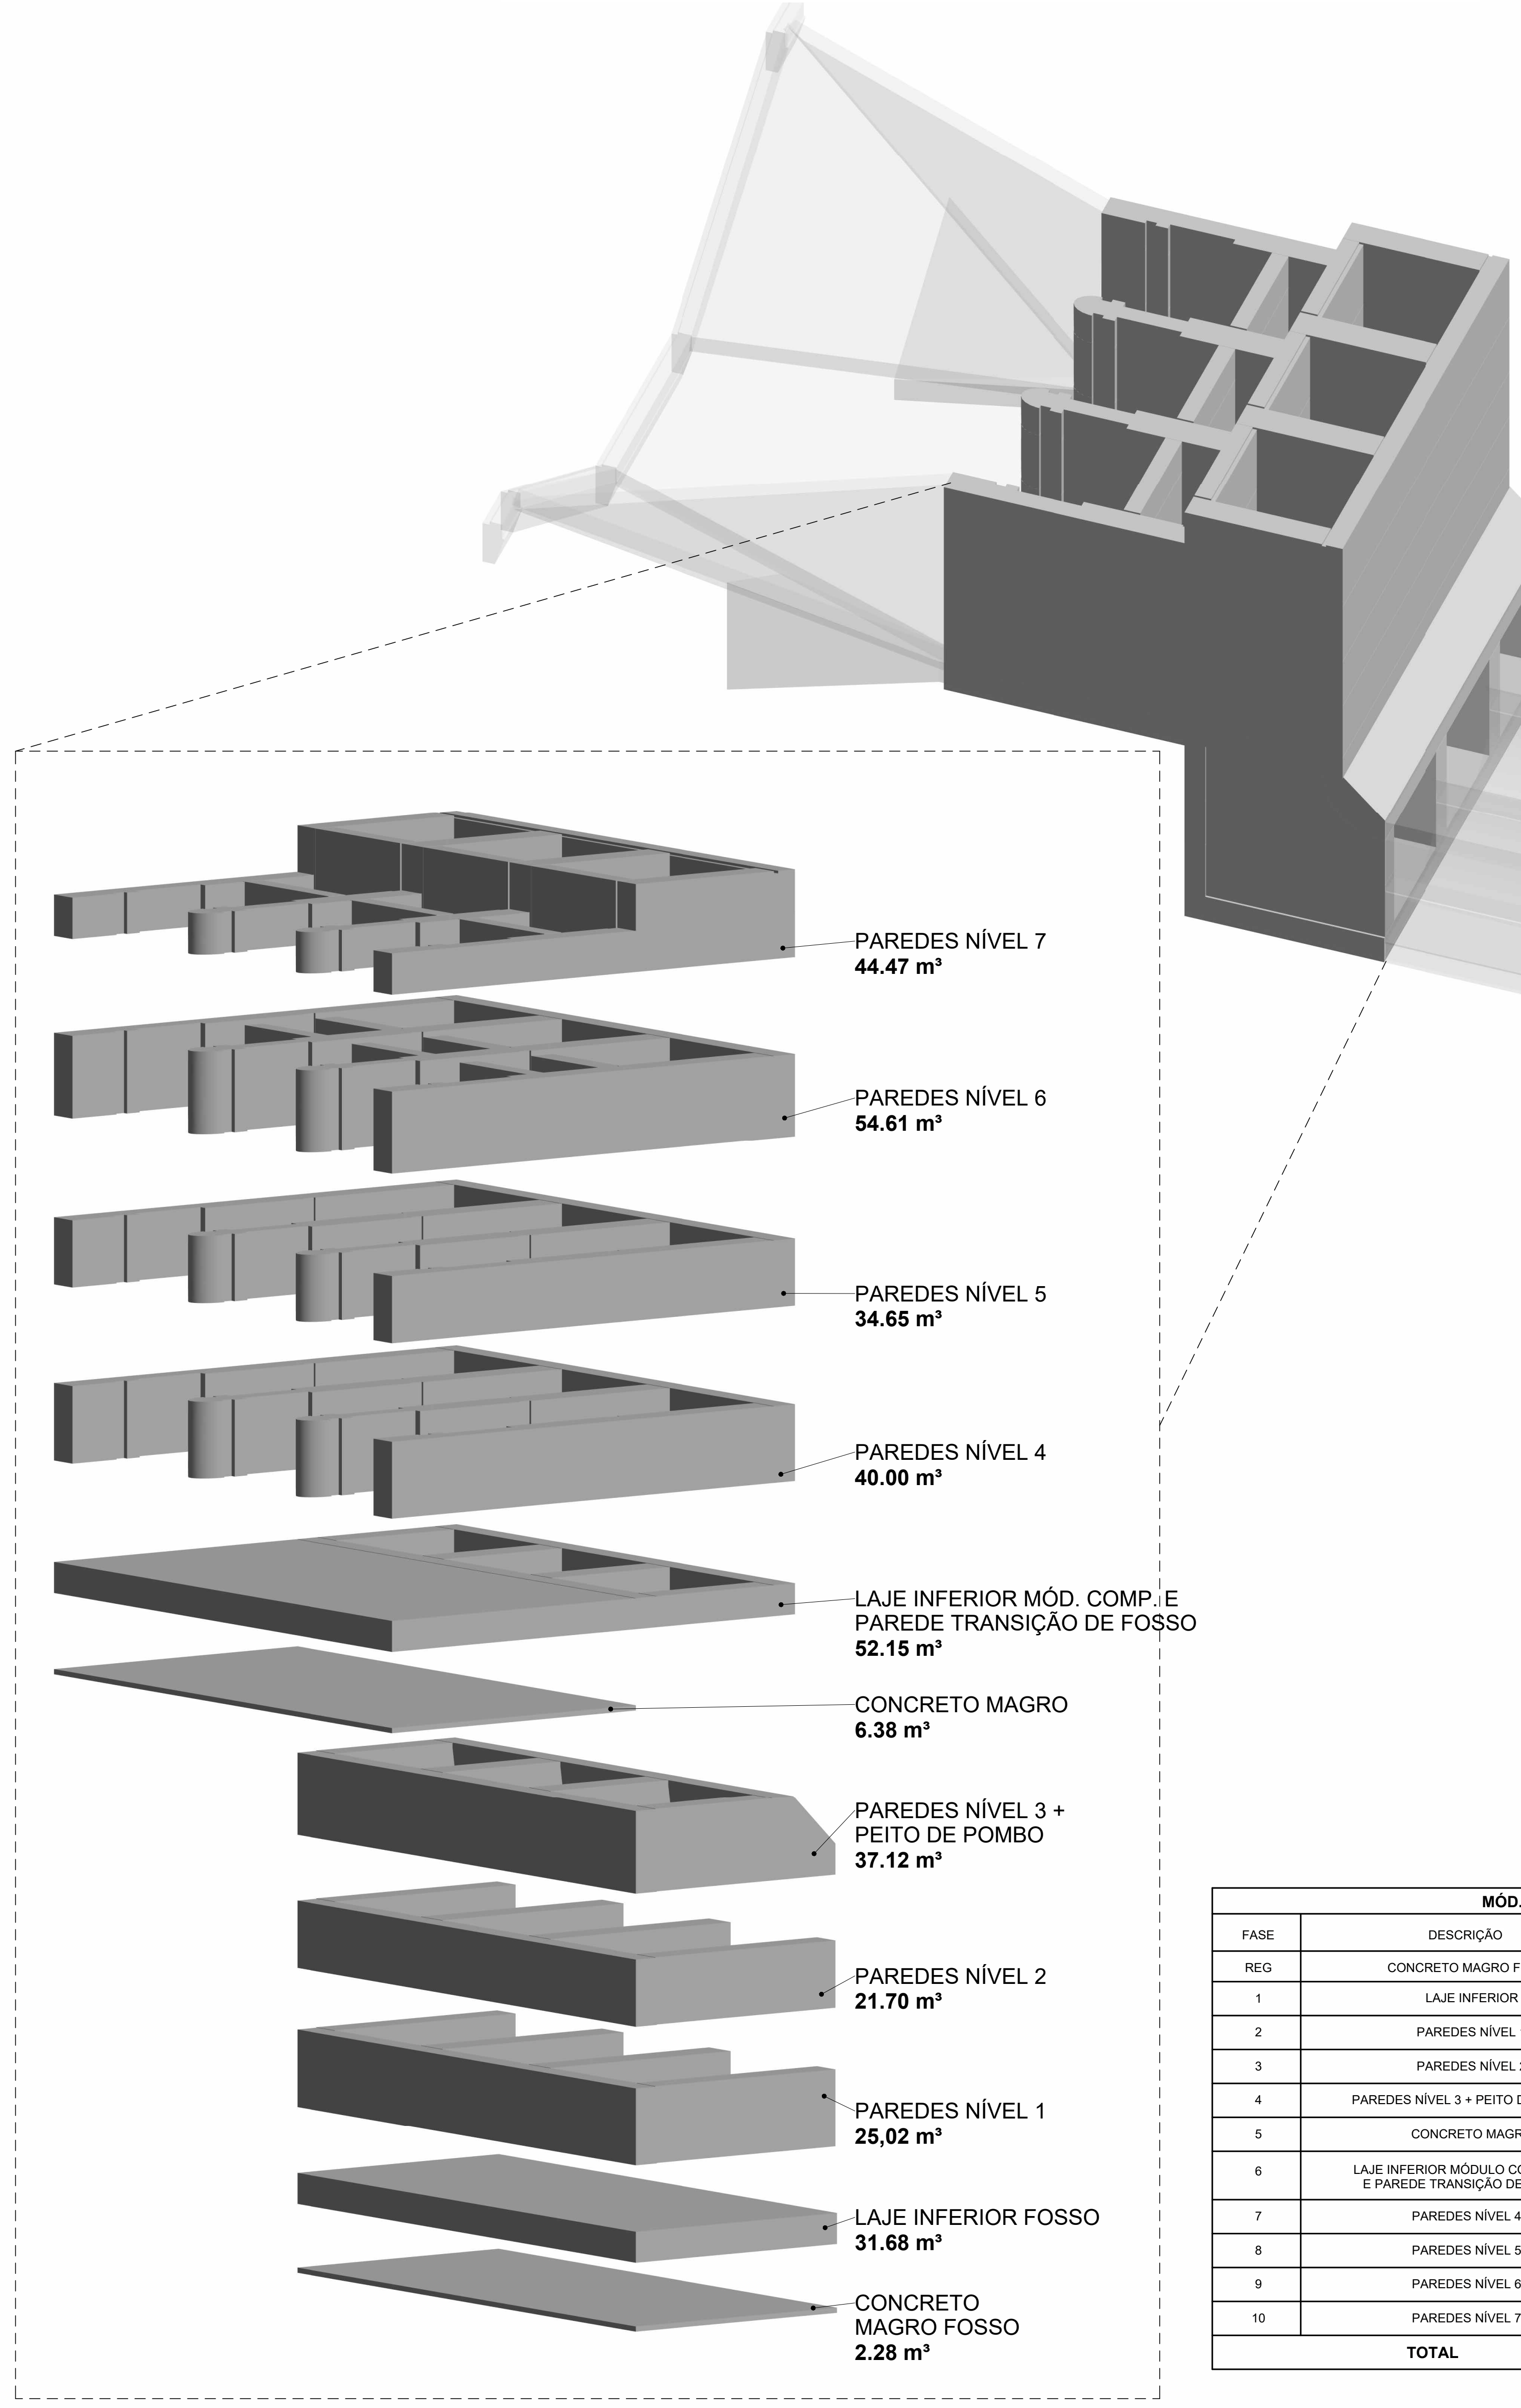

MÓD. COMPORTA			
FASE	DESCRIÇÃO	VOLUME (m³)	AÇO (KG)
REG	CONCRETO MAGRO FOSSO	2.28	0.00
1	LAJE INFERIOR	31.68	2020.41
2	PAREDES NÍVEL 1	25.02	1595.67
3	PAREDES NÍVEL 2	21.70	1383.93
4	PAREDES NÍVEL 3 + PEITO DE POMBO	37.12	2367.35
5	CONCRETO MAGRO	6.38	0.00
6	LAJE INFERIOR MÓDULO COMPORTA E PAREDE TRANSIÇÃO DE FOSSO	52.15	3325.90
7	PAREDES NÍVEL 4	40.00	2551.03
8	PAREDES NÍVEL 5	34.65	2209.83
9	PAREDES NÍVEL 6	54.61	3482.79
10	PAREDES NÍVEL 7	44.47	2836.10
TOTAL		**341.40**	**21773.00**

MÓDULO TUBO

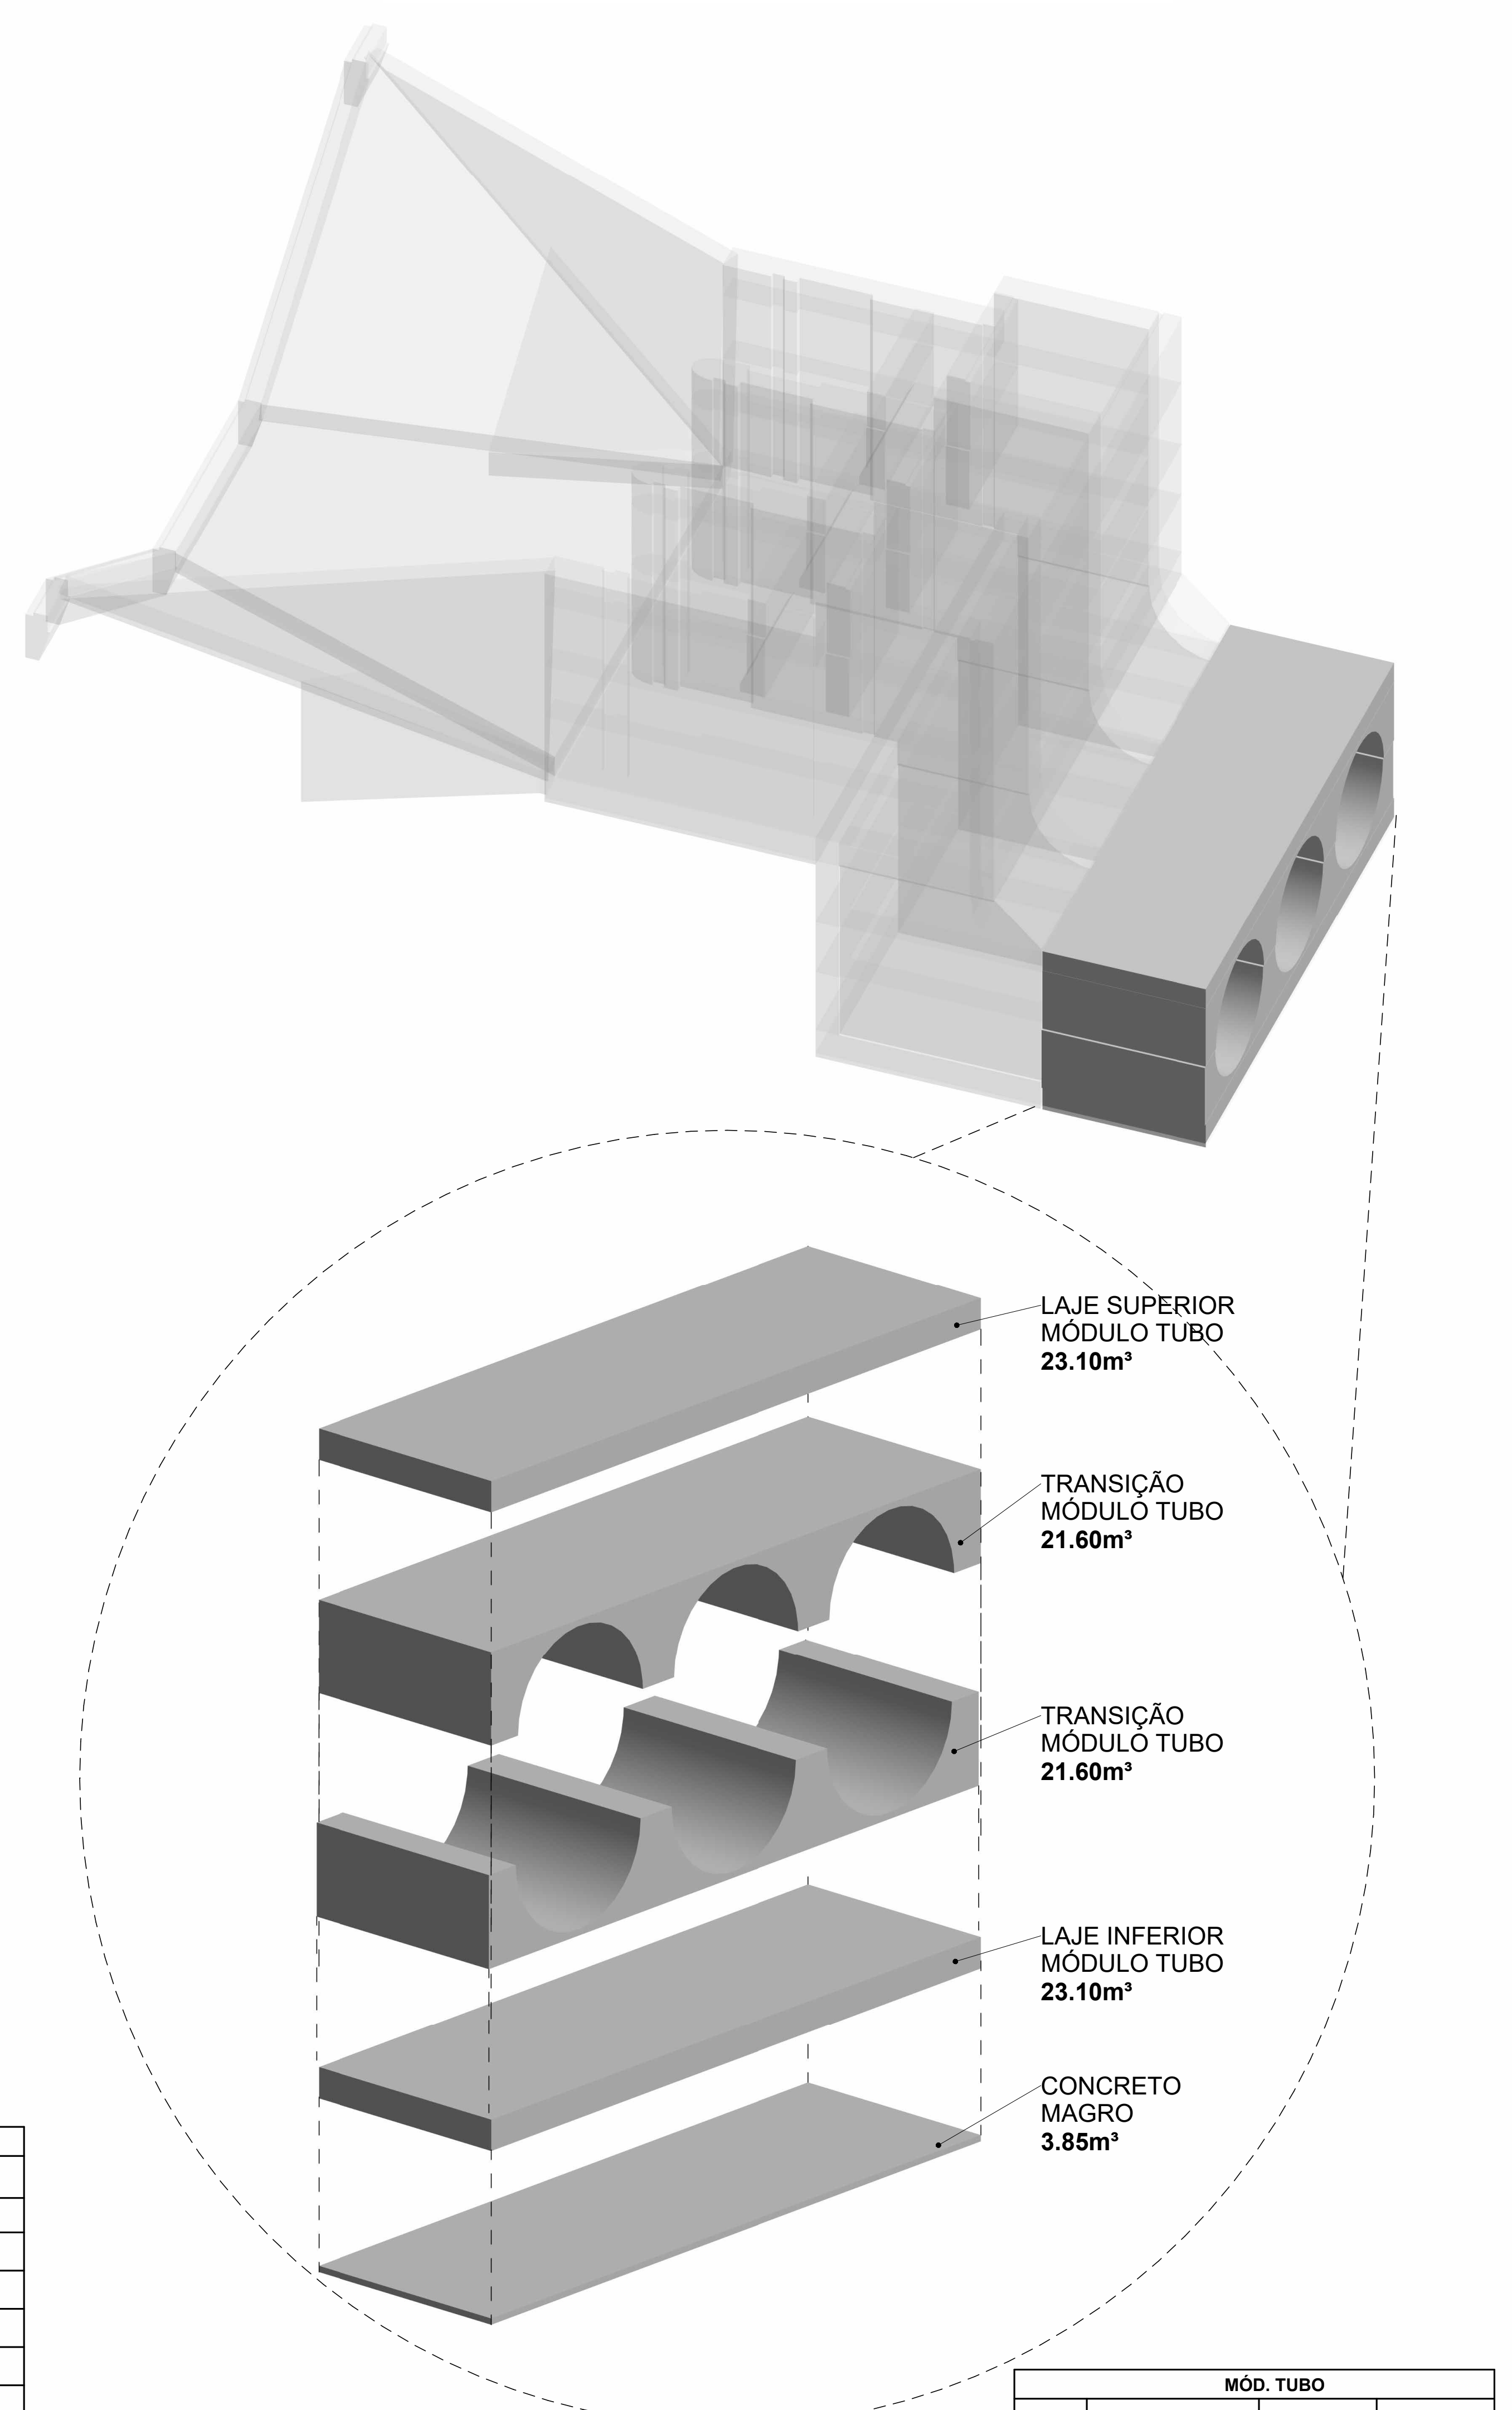
LAJE SUPERIOR MÓDULO TUBO 23.10m³
TRANSIÇÃO MÓDULO TUBO 21.60m³
TRANSIÇÃO MÓDULO TUBO 21.60m³
LAJE INFERIOR MÓDULO TUBO 23.10m³
CONCRETO MAGRO 3.85m³

MÓD. TUBO			
FASE	DESCRIÇÃO	VOLUME (m³)	AÇO (KG)
REG	CONCRETO MAGRO	3.85	0.00
1	LAJE INFERIOR	23.10	1305.38
2	PAREDES NÍVEL 1	21.60	1220.62
3	PAREDES NÍVEL 2	21.60	1220.62
4	LAJE SUPERIOR	23.10	1305.38
TOTAL		**89.40**	**5052.00**
